Cynllun Twf Gogledd Cymru
Adroddiad Perfformiad Chwarterol

Chwarter 2 2026-27

(Gorffennaf - Medi 2026)

THIS DOCUMENT IS ALSO AVAILABLE IN ENGLISH.



CYNNWYS

Crynodeb y Cyfarwyddwr Portffolio 3
Uchafbwyntiau Chwarterol 4
Dashfwrdd Cyflawni Prosiect 5
Dashfwrdd Buddion 6
Rhaglen Cysylltedd Digidol 8
Rhaglen Ynni Carbon Isel 10
Rhaglen Tir ac Eiddo 13
Rhaglen Bwyd-Amaeth a Thwristiaeth 15
Rhaglen Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel 17
Olrhain Cynnydd y Prosiectau, Prosiectau'r Cynllun Twf: 19
Proffil Dyraniad Cyllid Cyfalaf 20
ATODIAD A - Crynodeb Prosiectau - Cynllun Twf 21

CRYNODEB Y CYFARWYDDWR

Mae'r chwarter hwn wedi nodi carreg filltir arwyddocaol ar gyfer y Cynllun Twf gyda nifer sylweddol o brosiectau a gymeradwywyd yn flaenorol yn symud I gyflawni. Mae gennym un deg saith o brosiectau bellach yn cael eu cyflawni yn llawn neu rhannol. Cyrhaeddodd wariant y Cynllun Twf £38m, gyda chyfanswm y buddsoddiad yn cyrraedd £63m a rhagwelir y bydd yn cynyddu'n sylweddol dros y 2 flynedd nesaf wrth i brosiectau barhau i gyflawni trwy eu camau adeiladu. Mae ein ffigurau creu swyddi yn parhau i fod yn isel ar hyn o bryd gan fod y mwyafrif o swyddi yn cael eu creu ar ôl adeiladu pan fydd prosiectau'n symud i'w camau gweithredol.

Roedd rhai o'r cerrig milltir allweddol y chwarter hwn yn cynnwys y cytundebau cyllido a gwblhawyd ar gyfer prosiectau Egni, Ysgol Fusnes Albert Gubay a Phorthladd Mostyn.

Datblygodd y gwaith adeiladu ar draws amryw o safleoedd. Yn hen Ysbyty Gogledd Cymru, cwblhawyd gwaith diogelwch ar y safle a dechreuodd y gwaith cyweirio asbestos Cam 1. Ym Mharc Bryn Cegin, cwblhawyd gwaith caib a rhaw a gwaith codi strwythurau dur Cam 1, gyda'r gwaith cladio'r waliau a'r to ar y gweill. Dechreuodd y gwaith adeiladu ym mis Mehefin ar Adeilad y Derfynfa Forol ac unedau busnes yn safle Afon Goch o fewn Safleoedd ac Eiddo Gogledd Môn. Yn Hwb Economi Wledig Glynllifon, bu modd i'r elfen Llaeth Defaid Cymru symud ymlaen i'r cam adeiladu nesaf yn sgil cwblhau'r gwaith caib a rhaw.

Gydag achosion busnes ychwanegol yn cael eu cymeradwyo, cryfhaodd hyn y biblinell prosiectau. Ym mis Gorffennaf, cymeradwyodd yr Is-bwyllgor Lles Economaidd yr Achos Busnes Amlinellol ar gyfer Hwb Hydrogen Caergybi a'r Achosion Cyfiawnhad Busnes ar gyfer elfen Cartiau Gwyllt (Slate Explorer) y prosiect Antur Gyfrifol a Dylan's fel partner newydd ar gyfer yr Academi Croeso.

Bu cynnydd gyda gwaith cyflawni'r Cynlluniau Grant hefyd. Lansiwyd y cynlluniau Di-wifr Uwch a 4G+, aseswyd mynegiannau o ddiddordeb a gwahoddwyd ymgeiswyr i gyflwyno ceisiadau llawn yn Chwarter 3. Parhaodd prosiectau'r Gronfa Ynni Glân i symud ymlaen, yn ogystal a chynnal adolygiad blwyddyn gyntaf y Gronfa ym mis Gorffennaf, ystyriwyd yr heriau a'r llwyddiannau cychwynnol yn y flwyddyn gyntaf er mwyn llunio blaenoriaethau ar gyfer yr ail flwyddyn.

Gan edrych ymlaen, mae'r pwyslais yn dal ar gynnal cyflymder y cyflawni a gwireddu manteision buddsoddi ar draws y portffolio.



Hedd Vaughan-Evans

Cyfarwyddwr Portffolio
Uchelgais Gogledd Cymru

UCHAFBWYNTIAU



Cronfeydd Grant Digidol

Lansiwyd y cynlluniau Di-wifr Uwch a 4G+, aseswyd datganiadau o ddiddordeb a gwahoddwyd ymgeiswyr i gyflwyno ceisiadau llawn yn Chwarter 3



Cytundebau Cyllido Grant

Cwblhawyd y Cytundebau Cyllid Grant ar Egni, Ysgol Fusnes Albert Gubay a Phorthladd Mostyn.



Hwb Economi Wledig Glynllfion

Roedd cwblhau'r gwaith tir yn galluogi elfen Llaeth Defaid Cymru i symud ymlaen i'r cam adeiladu.



Parc Bryn Cegin

Cwblhawyd gwaith tir Cam 1 a chodi dur, gyda cladin waliau a tho ar y gweill



Cyn Ysbyty Gogledd Cymru

Cwblhawyd gwaith diogelwch y safle a dechreuwyd adfer asbestos Cam 1.



Safleoedd ac Adeiladau Gogledd Môn

Dechreuodd y gwaith adeiladu ym mis Mehefin ar Adeilad y Derfynfa Forol ac unedau busnes ar safle Afon Goch ar y prosiect.

DASHFWRDD CYFLWYNO PROSIECTAU

	Prosiectau yn Cyflawni (cyllid wedi'i ymrwymo	Prosiectau sy'n cael eu cyflawni'n rhannol (cyllid wedi'i ymrwymo)	Wedi'i gymeradwyo ond heb ei gyflawni eto (cyllid wedi'i ymrwymo)	Datblygu achosion busnes (cyllid wedi'i glustnodi)	Yn cael ei adolygu (cyllid wedi'i glustnodi)	Rhestr Wrth Gefn a Cronfa chwyddiant (cyllid heb ei ddyrannu)
Nifer y Prosiectau	15	2	1	8	0	7
Dyraniad Cyllid y Cynllun Twf (£234.85*)	£113.92m	£18.76m	£3.48m	£66.73m	-	£31.96m**
Cyfanswm Buddsoddiad (targedau achos busnes cronnus)	£270.22m	£105.14m	£19.09m	£358.81m	-	£241.59m**
Swyddi (targedau achos busnes cronnus	1,604	176	223	1,391	-	406**

* Nid yw cyllid y Cynllun Twf a ddangosir yma yn cynnwys £5.15m wedi'i ddyrannu tuag at gostau'r Swyddfa Rheoli Portffolio
** Mae'r ffigurau'n cynrychioli cydbwysedd y targed sydd i'w gyflawni gan brosiectau'r Rhestr Wrth Gefn

DASHFWRDD AMCANION GWARIANT Y PORTFFOLIO

Creu Swyddi *

Targed erbyn 2036 **4,000**

Targed hyd at ddiwedd 2026/27 **202**

	Gwir gyflawnwyd ar ddiwedd 2025/26	Gwir gyflawnwyd Ch2 2026/27	Gwir gyflawnwyd Ch4 2026/27
Cyfanswm swyddi	121	132	
Swyddi newydd	63	62	
Swyddi Adeiladu	58	70	

Buddsoddiad

Targed erbyn 2036 **Cyfanswm Buddsoddiad £1bn**

	Rhagolwg hyd at ddiwedd 2026/27	Gwir gyflawnwyd ar ddiwedd 2025/26	Gwir gyflawnwyd Ch1 2026/27	Gwir gyflawnwyd Ch2 2026/27	Gwir gyflawnwyd Ch3 2026/27	Gwir gyflawnwyd Ch4 2026/27
£ Buddsoddiad y Cynllun Twf	£65m	£30,652,413	£32,311,012	£37,842,753		
£ Cyfanswm Buddsoddiad	£120m	£34,208,618	£37,129,800	£ 63,155,577		

**Mae data am swyddi yn cael ei gasglu bob 6 mis, gan adrodd ar ffigyrau ym mis Hydref (diwedd Ch2) a mis Ebrill (diwedd Ch4).

DASHFWRDD BUDDION

Buddion

Refeniw wedi'i Sicrhau
£7,233,476

Incwm cyfalaf wedi'i drosoli
£81,016

Unigolion yn cwblhau cyrsiau CPD
355

Ymgysylltu â Gweithlu'r Dyfodol
6,878 o gyfranogwyr

Unigolion wedi cofrestru am brentisiaethau
25

Myfyrwyr yn cwblhau cymwysterau
235

Caffael

£89,874,294.74
Cyfanswm gwerth y contractau Cynllun Twf a ddyfarnwyd (yn cynnwys TAW)

£77,076,853.76
Cyfanswm gwerth y contractau Cynllun Twf a ddyfarnwyd i gyflenwyr Gogledd Cymru (yn cynnwys TAW)

86%
o gontractau'r Cynllun Twf wedi'u dyfarnu i gyflenwyr o ogledd Cymru

£72,872,823.47
Cyfanswm gwerth y contractau Cynllun Twf a ddyfarnwyd i fusnesau SME (yn cynnwys TAW)

81%
o gontractau'r Cynllun Twf wedi'u dyfarnu i fusnesau SME

DASHFWRDD BUDDION

Buddion

Unigolion wedi cofrestru am brentisiaethau **25**

Refeniw wedi'i Sicrhau **£7,233,476**

Incwm cyfalaf wedi'i drosoli **£81,016**

Ymgysylltu â Gweithlu'r Dyfodol **6,878** o gyfranogwyr

Unigolion yn cwblhau cyrsiau CPD **355**

Myfyrwyr yn cwblhau cymwysterau **235**

Caffael

£89,874,294.74

Cyfanswm gwerth y contractau Cynllun Twf a ddyfarnwyd (yn cynnwys TAW)

£77,076,853.76

Cyfanswm gwerth y contractau Cynllun Twf a ddyfarnwyd i gyflenwyr Gogledd Cymru (yn cynnwys TAW)

86%

o gontractau'r Cynllun Twf wedi'u dyfarnu i gyflenwyr o ogledd Cymru

£72,872,823.47

Cyfanswm gwerth y contractau Cynllun Twf a ddyfarnwyd i fusnesau SME (yn cynnwys TAW)

81%

o gontractau'r Cynllun Twf wedi'u dyfarnu i fusnesau SME

PERFFORMIAD Y RHAGLEN DDIGIDOL

Nod y Rhaglen

Cyflawni newid amlwg yn y cysylltedd digidol sydd ei angen i sicrhau y gall Gogledd Cymru gyflawni galw'r defnyddwyr, cynnal cyflymdra â gweddill y DU, datgloi potensial sectorau a safleoedd â blaenoriaeth am dwf a thanategu ecosystem arloesi ffyniannus.

Statws RAG

Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen

- Cynhaliwyd pedwerydd cyfarfod y Fforwm Telathrebu Rhanbarthol y chwarter hwn gan gynnwys cyflwyniadau i'r diwydiant telathrebu ar y Porthladd Rhydd a'r Parth Buddsoddi.
- Mae Cynlluniau Grant Di-wifr Uwch a 4G+ bellach wedi'u lansio gyda datganiadau o ddiddordeb wedi'u derbyn. Mae ceisiadau llawn bellach i fod i gael eu derbyn yn Ch3. Bydd y rownd nesaf o wahoddiadau i fynegi diddordeb ar gyfer y ddau gynllun yn cael ei baratoi yn Ch3 i'w lansio yn Ch4.



Ian Jones
Uwch Berchennog Cyfrifol



Stuart Whitfield
Rheolwr Rhaglen

Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw iddynt (dim angen gweithredu)

Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle)

Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys)

PERFFORMIAD Y RHAGLEN DDIGIDOL

Prosiect (Ariannwr y Prosiect)	Cam y prosiect	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter hwn)	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter nesaf	Statws RAG	Rhesymeg RAG
Canolfan Prosesu Signal Digidol Prifysgol Bangor	Prosiect yn cael ei gyflawni	• Cynigion cyllid (£1.5m) wedi'u cyflwyno i'r Engineering and Physical Sciences Research Council..	• Penderfyniad ar gyllid 3 blynedd o £1.5m gan EPSRC i'w gadarnhau		• Mae'r prosiect yn methu'r targed o ran sicrhau arian grant ychwanegol. • Mae cais mawr am gyllid allanol i sicrhau adnoddau ychwanegol am dair blynedd wedi'i gyflwyno • Ymgysylltu â busnes rhanbarthol wedi'i ohirio oherwydd problemau capasiti.
4G+ Uchelgais Gogledd Cymru	Prosiect yn cael ei gyflawni	• Cynhaliwyd y pedwerydd cyfarfod fforwm telathrebu. • Lansiwyd cynlluniau grant Diwydiant a'r Sector Cyhoeddus 4G+ gyda Mynegiadau o Ddiddordeb wedi'u derbyn.	• Adolygu a chymeradwyo mynegiadau o ddiddordeb 4G + a gwahoddiad i gyflwyno cais llawn. • Paratoi ail rownd o fynegi diddordeb i'w hagor yn Ch4.		• Mae'r ddau gynllun grant wedi lansio gyda lefel gref o ddiddordeb gan y diwydiant gyda mynegiadau ffurfiol o ddiddordeb wedi'u derbyn i'w hadolygu cyn gwahoddiadau ffurfiol i gyflwyno ceisiadau llawn yn Ch3.
Di-wifr Uwch Uchelgais Gogledd Cymru	Prosiect yn cael ei gyflawni	• Lansiwyd cynlluniau grant Technoleg Di-wifr Uwch gyda Mynegiadau o Ddiddordeb wedi'u derbyn.	• Adolygu a chymeradwyo datganiadau o ddiddordeb a gwahoddiad i gais llawn. • Paratoi ail rownd o fynegi diddordeb i'w agor yn Ch4		• Lansiwyd y cynlluniau grant gyda lefel gref o ddiddordeb yn y diwydiant gyda datganiadau diddordeb ffurfiol wedi'u derbyn i'w hadolygu cyn gwahoddiadau ffurfiol i gyflwyno ceisiadau llawn yn Ch3.
LPWAN Uchelgais Gogledd Cymru	Prosiect yn cael ei gyflawni	• Adolygwyd cynlluniau defnyddio LoRaWAN terfynol a pharatowyd argymhellion.	• Cymeradwyo Cynlluniau Defnyddio a chyflawni i ddechrau.		• Mae argymhellion ar gyfer Cynlluniau Defnyddio i'w cymeradwyo wedi'u paratoi i'w hystyried gan yr Is-bwyllgor Lles Economaidd yn Ch3

PERFFORMIAD Y RHAGLEN YNNI CARBON ISEL

Nod y Rhaglen

Datgloi buddion economaidd prosiectau ynni carbon isel trawsffurfiol a sefydlu Gogledd Cymru fel un o leoliadau arweiniol y DU ar gyfer cynhyrchu ynni carbon isel, arloesedd a buddsoddi yn y gadwyn gyflenwi.

Statws RAG

Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen

- **Cydnerth** - Gwaith Gwedd 1 wedi'i gwblhau, dad-weithredu'r safle.
- **Cronfa Ynni Glân (Ynni Lleol Blaengar)** – Buddsoddiadau parhaus a wnaed o is-gronfeydd sector Preifat a Gwirfoddol.
- **Canolfan Arloesi, Busnes a Sgiliau Trawsfynydd** – Penodi contractwr i ddarparu'r pecynnau gwaith gofynnol i lywio'r Achos Busnes Llawn, yn ogystal â chynhyrchu'r ddogfen Achos Busnes Llawn.
- **Egni** – Cytundeb cyllido grant wedi'i sefydlu a gwaith safle ar y gweill.
- **Hwb Hydrogen Caergybi** – Cymeradwyo Achos Busnes Amlinellol.



Dylan Williams
Uwch Berchennog Cyfrifol



Meghan Davies
Rheolwr Rhaglen

Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw iddynt (dim angen gweithredu)

Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle)

Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys)

PERFFORMIAD Y RHAGLEN YNNI CARBON ISEL

Prosiect (Ariannwr y Prosiect)	Cam y prosiect	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter hwn)	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter nesaf)	Statws RAG	Rhesymeg RAG
Cydnerth (Morlais) Menter Môn	Prosiect yn cael ei gyflawni	• Adroddiad allyriadau a bioamrywiaeth Blwyddyn 1 wedi'i dderbyn. • Parhau i ymgysylltu â'r datblygwyr a'r grid.	• Parhau i ymgysylltu â'r datblygwyr a'r grid.		Mae'r prosiect wedi symud i'r cyfnod cyflawni ac mae'n mynd rhagddo'n dda.
Egni Prifysgol Bangor	Prosiect yn cael ei gyflawni	• Cytundeb Arian Grant wedi'i lofnodi. • Tystiolaeth amodau cynsail wedi'i dderbyn. • Gwaith yn mynd rhagddo'n dda gyda ffrâm ddur wedi'i chodi.	• Gwaith parhaus. • Hawliad cyntaf wedi'i gyflwyno.		Prosiect wedi symud i gyflawni a gwaith wedi dechrau ar y safle.
Cronfa Ynni Glan Uchelgais Gogledd Cymru	Prosiect yn cael ei gyflawni	• Adolygiad 1 flwyddyn wedi'i gynnal gydag ymgynghorwyr y gronfa. • Parhau i gyflwyno Mynegiadau o Ddiddordeb ar draws pob un o'r 3 is-gronfa. • Parhau i gyhoeddi arian o is-gronfa wirfoddol a phreifat. • Digwyddiadau hyrwyddo ac ymgysylltu.	• Digwyddiadau hyrwyddo ac ymgysylltu. • Parhau â'r gwaith o asesu ceisiadau a dyfarnu. • Creu cronfa ddata cyflenwyr.		Mae'r prosiect yn wyrdd gan fod Achos Busnes Llawn wedi'i gymeradwyo a'r gronfa wedi'i lansio.
Hwb Hydrogen Caergybi Menter Môn	Datblygu'r Achos Busnes Llawn	Cymeradwyo'r Achos Busnes Amlinellol a chaniatawyd penderfyniad cynllunio.	• Menter Môn i barhau i ymgysylltu i ddenu defnyddwyr • Paratoi Achos Busnes Llawn.		Symudodd y statws RAG i ambr wrth i'r prosiect Achos Busnes Amlinellol gael ei gymeradwyo ac mae bellach yn gweithio tuag at Achos Busnes Llawn.
Canolfan Arloesi, Busnes a Sgiliau Trawsfynydd Cyngor Gwynedd	Datblygu'r Achos Busnes Llawn	• Penodwyd contractwr i ddarparu'r pecynnau gwaith gofynnol i hysbysu'r Achos Busnes Llawn, yn ogystal â chynhyrchu'r ddogfen Achos Busnes Llawn.	• Paratoi Achos Busnes Llawn. • Mynd i'r afael â materion sydd heb eu hystyried gan y Swyddfa Rheoli Portffolio gan gynnwys cytundebau cynllunio a phrydles tir.		Mae'r prosiect yn wyrdd gan fod yr Achos Busnes Amlinellol wedi'i gyflwyno a'i gymeradwyo ac mae yna 12 mis i gyflwyno'r Achos Busnes Llawn.

PERFFORMIAD Y RHAGLEN TIR AC EIDDO

Nod y Rhaglen

Mynd i'r afael â'r diffyg tir ac eiddo addas ar gyfer twf busnes a dod â safleoedd ymlaen ar gyfer datblygiadau tai. Cyflawni gwelliannau sy'n symbylu buddsoddiad mewn safleoedd ac eiddo ym mhorthladd Caergybi a'r ardal ehangach. Hwyluso rhaglenni eraill drwy sicrhau bod y seilwaith tir ac eiddo cywir ar gael

Statws RAG

Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen

- **Cyn Ysbyty Gogledd Cymru** - Mae gwaith diogelwch y safle gan gynnwys ffensys a chamerâu teledu cylch cyfyng wedi'i gwblhau ac mae contractwr asbestos wedi dechrau gwaith adfer Cam 1.
- **Parc Bryn Cegin -** Mae gwaith tir a chodi dur wedi'u cwblhau ar Gam 1 ac mae cladin i waliau a tho ar y gweill ar hyn o bryd. Mae'r ddogfennaeth ar gyfer Cam 2 yn cael ei chwblhau gyda tharged o ganol mis Hydref a bydd gwaith galluogi safle yn dechrau ym mis Tachwedd.
- **Safleoedd ac Adeiladau Gogledd Môn -** Dechreuodd OBR Construction ar y gwaith ar adeilad y Derfynnell Morol a safle Afon Goch ar gyfer yr unedau busnes ym mis Mehefin ac mae cynnydd da yn cael ei wneud.
- **Ysgol Fusnes Albert Gubay -** Cwblhawyd y Cytundeb Cyllid Grant ym mis Awst, dechreuodd Wynne Construction alluogi gwaith yn yr un mis gyda'r gwaith contract ar y gweill ym mis Medi.
- **Porthladd Mostyn -** Cwblhawyd y Cytundeb Cyllid Grant ym mis Medi ac mae'r Porthladd i gyflwyno eu cais cyntaf am waith a wnaed hyd at ddiwedd y mis.



David Fitzimon
Uwch Berchennog Cyfrifol



David Mathews
Rheolwr Rhaglen

Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw iddynt (dim angen gweithredu)

Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle)

Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys)

PERFFORMIAD Y RHAGLEN TIR AC EIDDO

Prosiect (Ariannwr y Prosiect)	Cam y prosiect	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter hwn)	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter nesaf)	Statws RAG	Rhesymeg RAG
Cyn Ysbyty Gogledd Cymru Jones Bros (Ruthin) Limited / Cyngor Sir Ddinbych	Cam 1 y Prosiect yn cael ei gyflawni	• Ffens perimedr ardal gwaith wedi'i gwblhau gyda chamerâu teledu cylch cyfyng wedi'u gosod. • Mae contractwr asbestos cymeradwy, UK Environmental wedi dechrau gwaith adfer Cam 1. • Mae arolygydd wedi cael cyfarwyddyd i gynnal arolygon ar gyfer adeiladau sy'n destun cais i ddymchwel am ganiatâd adeilad rhestredig.	• Cychwyn arolygon ar gyflwr yr adeiladau wedi'i gynnwys yn y cais Caniatâd Adeilad Rhestredig. • Gwaith dymchwel i ddechrau.		• Materion iechyd a diogelwch sylweddol ar y safle yn sgil cyflwr yr adeiladau a'r halogiad ar y safle. • Mater parhaus o dresmasu gan aelodau o'r cyhoedd. • Cais Adeilad Rhestredig presennol i ddymchwel y strwythurau sy'n weddill yn destun trafodaethau manwl gyda CADW.
Parc Bryn Cegin, Bangor Llywodraeth Cymru / Uchelgais Gogledd Cymru	Cam 1 y Prosiect yn cael ei gyflawni	• Gwaith tir a chodi dur ar gyfer Cam 1 wedi'i gwblhau. • Cytunwyd ar benawdau'r telerau ar gyfer Cam 2. • Derbyniwyd swm tendr Cam 2 ac mae'r ddogfennaeth derfynol yn cael ei pharatoi.	• Cwblhau gwaith cladin ar gyfer Cam 1 a gosod slabiau llawr a dechrau gwaith mewnol. • Cwblhau Gweithred Amrywio Cam 2 ar gyfer y Cytundeb Menter ar y Cyd rhwng Uchelgais Gogledd Cymru a Llywodraeth Cymru. • Dechrau gwaith Cam 2.		• Prosiect yn gwneud cynnydd da ar y safle a dim materion i'w hadrodd.
Porth Wrecsam Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam	Datblygu'r Achos Busnes Llawn	• Arolygon ecolegol wedi'u cwblhau. • Penodwyd ymgynghorydd i ddatrys ffosffadau. • Trafodaethau yn parhau gyda thirfeddianwyr ar gyfer cydosod y safle. • Y tendr ar gyfer penodi partner datblygu wedi cau.	• Cynnydd parhaus ar gydosod.. • Penderfyniad ar y cais cynllunio amlinellol. • Cwblhau penodiad y partner datblygu. • Drafftio Achos Busnes llawn i ddechrau ym mis Hydref.		• Cydosod y safle, • Penodi partner datblygu. • Datrysiad ar gyfer gollyngiadau ffosffad i Afon Dyfrdwy.

PERFFORMIAD Y RHAGLEN TIR AC EIDDO

Prosiect (Ariannwr y Prosiect)	Cam y prosiect	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter hwn)	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter nesaf)	Statws RAG	Rhesymeg RAG
Safleoedd ac Adeiladau Gogledd Môn Sites Cyngor Sir Ynys Môn	Prosiect yn cael ei gyflawni	• Dechreuodd y Prif Gontractwr ar waith ar Adeilad y Derfynfa Forol a safle Afon Goch ym mis Mehefin 2026. • Cytundeb Cyllid Grant wedi'i gwblhau.	• Cyflawni'r gwaith adeiladu yn barhaus.		• Prosiect yn gwneud cynnydd da ar y ddau safle.
Porth y Porthladd rhydd Cyngor Sir Ynys Môn	Wedi'i gymeradwyo ond ddim yn cyflawni ar hyn o bryd	• Penodi Prif Gontractwr ar gyfer safle PEBOC. • Tendr ar gyfer penodi Prif Gontractwr ar gyfer Plot 2 wedi'i gwblhau.	• Cwblhau'r Cytundeb Cyllid Grant. • Penodi Prif Gontractwyr ar gyfer Plot 2 Tregarnedd. • Dechrau gwaith ar y safle.		• Prosiect ar y trywydd iawn i'w gychwyn ar y safle ddiwedd Ch2 Blwyddyn Ariannol 26/27.
Padeswood Trafnidiaeth Cymru	Datblygu'r Achos Busnes Llawn	• Mae Memorandwm o Ddealltwriaeth wedi'i gwblhau.	• Darparu amserlen gadarn ar gyfer cyflawni'r prosiect. • Network Rail i rannu Rhaglen integredig o waith. • Network Rail i ddarparu costau diwygiedig ar gyfer y prosiect.		• Gwaith dylunio a chostau trac Network Rail yn parhau.
Ysgol Fusnes Albert Gubay Prifysgol Bangor	Prosiect yn cael ei gyflawni	• Prif Gontractwr wedi'i benodi gan Brifysgol Bangor. • Cytundeb Cyllid Grant wedi'i gwblhau. • Dechreuodd y gwaith galluogi ym mis Awst ac yna gwaith ar y prif safle ym mis Medi.	• Stribed asbestos i'w gwblhau erbyn mis Tachwedd. • Gwaith dymchwel i'w gwblhau cyn Nadolig 2026.		• Prosiect yn gwneud cynnydd da ar y safle a dim problemau i'w hadrodd.
Porthladd Mostyn Mostyn Estates	Prosiect yn cael ei gyflawni	• Gwaith tir wedi'i gwblhau. • Cytundeb Cyllid Grant wedi'i gwblhau. • Dechreuodd y gwaith carthu ar gyfer y brif sianel..	• Cadarnhau tendrau pecynnau gwaith ffensys diogelwch a'r padiau lifft trwm. • Gwaith cladin i ddechrau ar adeiladau Marsh Row.		• Prosiect yn gwneud cynnydd da. • Mater parhaus o dresmasu gan aelodau o'r cyhoedd.

PERFFORMIAD Y RHAGLEN BWYD-AMAETH A THWRISTIAETH

Nod y Rhaglen

Adeiladu economi sylfaen mwy cynaliadwy, bywiog a gwydn o fewn y rhanbarth, gan wneud y gorau o gyfleoedd am gyflogaeth a ffyniant drwy ein hamgylchedd a'n tirwedd.

Statws RAG

Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen

- **Anturiaethau Gyfrifol –** Cymeradwywyd Achos Cyfiawnhad Busnes y Slate Explorer gan yr Is-bwyllgor Lles Economaidd a derbyniodd adborth positif ar ei Gynllun Sgiliau gan y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol.
- **Academi Croeso –** Sicrhawyd cymeradwyaeth ar gyfer yr Achos Cyfiawnhad Busnes yn cadarnhau mai Dylan's Restaurant Ltd oedd y partner lloeren newydd. Mae gweithgarwch caffael wedi symud ymlaen dros y misoedd ar gyfer gwaith trydanol mawr ar gyfer prosiect Dylan's.
- **Hwb Economi Wledig Glynllifon –** Mae'r gwaith sylfaen ar gyfer elfen Llaeth Defaid Cymru wedi'i gwblhau, gyda'r gwaith adeiladu'n mynd rhagddo i'r cam nesaf. Derbyniwyd cymeradwyaeth hefyd ar gyfer argymhelliad caffael Cam 2 Datblygu Llaeth Cynaliadwy, yr Hawliad cyntaf a dderbyniwyd o'r prosiect.
- **Dyfodol Venue Cymru –** Sicrhaodd y prosiect £1 miliwn gan Gyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer 2026/27, ochr yn ochr â chyllid datgarboneiddio ychwanegol gan Lywodraeth Cymru ar gyfer gwaith i wella'r awditoriwm.



Sioned Williams
Uwch Berchennog Cyfrifol



Elliw Hughes
Rheolwr Rhaglen

Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw iddynt (dim angen gweithredu)

Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle)

Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys)

PERFFORMIAD Y RHAGLEN BWYD-AMAETH A THWRISTIAETH

Prosiect (Ariannwr y Prosiect	Cam y prosiect	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter hwn)	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter nesaf)	Statws RAG	Rhesymeg RAG
Hwb Economi Gwledig Glynllifon Grŵp Llandrillo Menai	Defaid Llaeth Cymru yn cael ei gyflawni. Llaeth Cynaliadwy - Cymeradwywyd gan y BJC. Hwb yn datblygu FBC	• Llaeth Defaid Cymru – Mae'r gwaith adeiladu yn parhau i fod ar amser ac yn mynd rhagddo'n dda, gyda'r prosiect yn symud tuag at y cam adeiladu fertigol. • Datblygu Llaeth Cynaliadwy – Mae'r adroddiad argymhelliad caffael ar gyfer Cam 2 wedi'i gymeradwyo a'i lofnodi. • Datblygu Hwb – Mae gwaith parhaus yn parhau ar gynigion cynllunio.	• Cyflwyno'r hawliad prosiect cyntaf. • Dilyniant y gweithgareddau caffael sy'n weddill ar gyfer Datblygu Llaeth Cynaliadwy a Llaeth Defaid Cymru. • Cyflwyno cais cyn-gynllunio'r Hwb..		• Angen caniatâd cynllunio ar gyfer Hwb. • Cynnydd mewn costau ar gyfer yr Datblygiad Llaethdy Cynaliadwy oherwydd chwyddiant. • Gweithgaredd caffael heb ei gwblhau.
Academi Croeso Grŵp Llandrillo Menai	Prosiect yn cael ei gyflawni	• Prosiect Amnewid Dylan's – Yr Achos Busnes Amlinellol wedi'i gymeradwyo gan yr Is-bwyllgor Lles Economaidd. • Caffael – Mae Uchelgais Gogledd Cymru wedi cymeradwyo'r gweithgaredd caffael ar gyfer pecyn mawr o waith Prosiect Amnewid Dylan's. • ZipWorld – Cynhaliwyd trafodaethau gyda ZipWorld ar drefniadau cyflawni prosiectau a'r camau nesaf.	• Cwblhau'r trefniadau masnachol ar gyfer prosiect lloeren Dylan's. • Cwblhau llofnodi'r cytundeb cefn-wrth-gefn rhwng GLlM a Dylan's. • Cytuno ar ffordd ymlaen ar gyfer cyflawni'r prosiect lloeren ZipWorld. • Cytuno ar amserlen a cherrig milltir allweddol ar gyfer cyflawni elfen Hwb ar gampws Llandrillo yn Rhos Grŵp Llandrillo Menai.		• Cwblhau cytundebau cefn-wrth-gefn. • Gweithgaredd caffael anghyflawn. • Memorandwm o Gyd-ddealltwriaeth gyda phartneriaid strategol. • Oedi gyda'r hawlio yn erbyn y proffil.

PERFFORMIAD Y RHAGLEN BWYD-AMAETH A THWRISTIAETH

Prosiect (Ariannwr y Prosiect	Cam y prosiect	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter hwn)	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter nesaf)	Statws RAG	Rhesymeg RAG
Dyfodol Venue Cymru Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy	Datblygu'r Achos Busnes Llawn	• Mae'r adroddiad argymhelliad caffael ar gyfer seddi'r awditoriwm wedi'i gwblhau a'i lofnodi. • Mae datblygiad yr Achos Busnes Llawn yn parhau i fynd rhagddo. • Mae gweithgareddau cynllunio a dylunio wedi datblygu, gan gefnogi'r cam nesaf o ddatblygu prosiectau.	• Cyflwyno'r cais cynllunio, ynghyd â'r arolygon ategol angenrheidiol. • Cyflwyno'r Achos Busnes Llawn i'r is-bwyllgor. • Gweithgaredd caffael cynnydd i gefnogi cyflawni prosiectau.		• Caniatâd cynllunio i'w sicrhau. • Oedi gyda'r caffael o ganlyniad i ail sgopio adnewyddu'r awditoriwm. .
Anturiaethau Cyfrifol ZipWorld	Slate Explorer - Yn cael ei gyflawni Datblygu BJC / Achos Busnes Llawn	• Slate Explorer - Mae'r Achos Cyfiawnhad Busnes wedi'i gymeradwyo gan yr Is-bwyllgor Lles Economaidd. • Cynllunio Slate Explorer - Ymgysylltu parhaus yn parhau gydag ymgynghoreion statudol a rhanddeiliaid cynllunio i gefnogi datblygiad prosiectau. • Mae gweithgarwch caffael ar gyfer prosiect Slate Explorer yn parhau i fynd rhagddo, gan gefnogi'r cam nesaf o gyflawni.	• Cwblhau gweithgareddau caffael ar gyfer yr elfen Slate Explorer. • Sicrhau cymeradwyaeth cynllunio ar gyfer y Slate Explorer. • Cytuno ar amserlen ar gyfer datblygu a chyflwyno'r Achos Busnes nesaf. • Cwblhau a selio'r Cytundeb Cyllid Grant ar gyfer Slate Explorer.		• Caniatâd cynllunio i'w sicrhau. • Slate Explorer mewn gweithgaredd caffael. • Oedi gyda'r amserlenni o ganlyniad i ganiatâd cynllunio.

PERFFORMIAD Y RHAGLEN ARLOESI MEWN GWEITHGYNHYRCHU GWERTH UCHEL

Nod y Rhaglen

Cyfnerthu lleoliad Gogledd Cymru fel clwstwr gweithgynhyrchu gwerth uchel pwerus ac arloesol, sy'n adeiladu ar arbenigedd presennol ac arbenigedd byd-eang i greu sail economaidd gwerth uwch, mwy amrywiol sy'n cefnogi trosglwyddo i economi carbon isel.

Statws RAG

Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen

- Datblygodd y **Ganolfan Peirianneg ac Opteg Menter** Achosion Cyfiawnhad Busnes ar gyfer Labordy Offer a Hydrogen Plas Coch. Integreiddio offer newydd i'r cwricwlwm, gan gefnogi sgiliau hirdymor a chanlyniadau arloesi.
- Mae'r **Ganolfan Biotechnoleg Amgylcheddol** yn bwrw ymlaen â gwaith ychwanegol ar ôl dyfarnu tendr o ganlyniad i'r tanwariant.
- **Society 5.0** - Rhaglen offer fawr yn parhau, gyda'r dyluniad terfynol a'r costau wedi'u cytuno ar gyfer yr ystafell sinteru.
- **Prosiect Prince Knauf** - Gwaith adfer safle ar y gweill ar ôl cymeradwyo cynllunio. Mae sicrhau caniatâd cynllunio llawn yn parhau i fod yn ddibyniaeth allweddol, a disgwylir y bydd yn cael ei ystyried gan y Pwyllgor Cynllunio yn Ch3.
- Gwaith adnewyddu **Porth Busnes Prifysgol Wrecsam** - Theatr Nick Whitehead wedi'i gwblhau a'i ailagor. Gweithgaredd caffael a dylunio yn mynd rhagddo ar gyfer camau nesaf y prosiect.



Tony Ward
Uwch Berchennog Cyfrifol



Elliw Hughes
Rheolwr Rhaglen

Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw iddynt (dim angen gweithredu)

Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle)

Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys)

PERFFORMIAD Y RHAGLEN ARLOESI MEWN GWEITHGYNHYRCHU GWERTH UCHEL

Prosiect (Ariannwr y Prosiect)	Cam y prosiect	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter hwn)	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter nesaf)	Statws RAG	Rhesymeg RAG
Canolfan Opteg a Pheirianneg Menter Prifysgol Wrecsam	Prosiect yn cael ei gyflawni	• Achos Cyfiawnhad Busnes Hydrogen Drafft wedi'i gyflwyno i'w adolygu. • Ymgysylltu parhaus â busnesau rhanbarthol i wneud y defnydd mwyaf o'r Ganolfan Opteg a Pheirianneg Menter. • Gweithgaredd caffael yn mynd rhagddo.	• Ystyriaeth Achos Cyfiawnhad Busnes ar gyfer Offer Plas Coch a Labordy Hydrogen. • Caffael wedi'i gwblhau ar gyfer y prosiect.		• Prosiect yn agosáu at statws gweithredol llawn. • Mân oedi i gyflawni'r prosiect oherwydd caffael a chwblhau contractau. • Buddion yn parhau i gael eu gwireddu ar draws y prosiect.
Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol Prifysgol Bangor	Prosiect yn cael ei gyflawni	• Dyfarniad tendr ar gyfer Gwaith ychwanegol Henfaes. • Mae hyfforddiant ar yr offer arbenigol newydd ar gyfer staff yn parhau.	• Ymgymryd â phrosiectau cychwynnol gan ddefnyddio cyfleuster Bioadweithydd newydd. • Hyfforddiant parhaus ar offer newydd. • Dechrau ar gyflwyno'r gwaith ychwanegol.		• Prosiect yn agosáu at statws gweithredol llawn... • Buddion yn cael eu gwireddu • Ychydig o oedi i waith ychwanegol
Society 5.0 Prifysgol Wrecsam	Prosiect yn cael ei gyflawni	• Offer Festo awtomataidd wedi'i osod yn CanfodAU. • Dril cyfansawdd wedi'i gyflwyno a'i osod. • Cytunodd Wynne Construction ar y dyluniad terfynol a'r pris ar gyfer cwblhau'r ystafell sinteru.	• Offer a ddefnyddir yn y cwricwlwm. • Cychwyn gwaith adnewyddu ystafell sinteru. • Hawlio gwariant llawn y prosiect.		• Cynhaliwyd digon o brofion o'r farchnad ar gyfer yr offer sy'n weddill. • Rhywfaint o oedi oherwydd gweithgaredd caffael. • Prosiect yn agosáu at statws gweithredol llawn.

PERFFORMIAD Y RHAGLEN ARLOESI MEWN GWEITHGYNHYRCHU GWERTH UCHEL

Prosiect (Ariannwr y Prosiect)	Cam y prosiect	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter hwn)	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter nesaf)	Statws RAG	Rhesymeg RAG
Project Prince Knauf	Datblygu'r Achos Busnes Llawn	• Dechreuodd y gwaith adfer safle ar ôl cymeradwyo cynllunio unfrydol ym mis Gorffennaf. • Mae gwaith dylunio manwl ar gyfer y prif adeilad yn parhau i fynd rhagddo. • Ymgysylltu parhaus â rhanddeiliaid allweddol i sicrhau caniatâd cynllunio a mynd i'r afael â gofynion amgylcheddol. • Gweithgaredd caffael, pecyn cyntaf wedi'i ryddhau ar Sell2Wales	• Sicrhau caniatâd cynllunio ar gyfer yr adeilad fertigol. • Cytuno ar yr amserlen ar gyfer cyflwyno'r Achos Busnes Llawn. • Parhau â gweithgarwch caffael i gefnogi cyflawni'r prosiect.		• Proses Cynllunio ac Amgylcheddol gymhleth i gael caniatâd, ond digon o ymgysylltu â rhanddeiliaid i liniaru cymaint o risg â phosib.
Porth Busnes Prifysgol Wrecsam	Datblygu'r Achos Busnes Llawn	• Proses dendro ar gyfer Gwasanaeth Cyn-Adeiladu ar gyfer y prif adeilad ar y gweill. • Gwasanaeth Cyn Adeiladu ar gyfer Adeilad Catrin Finch yn cael ei gyflawni • Gwaith adnewyddu Nick Whitehead wedi'i gwblhau a'i ailagor.	• Nodwyd y contractwr a ffefrir ar gyfer Cam 2 y Porth • Datblygwyd gweithgareddau cyn-adeiladu ar gyfer Canolfan Catrin Finch, gyda dylunio a datblygu costau wedi'u hadolygu. • Caffael cytundeb gwasanaeth cyn adeiladu wedi'i gwblhau, ar gyfer y prif adeilad.		• Cynnydd at yr Achos Busnes Llawn yn mynd yn dda. • Cytundeb Cyllid Grant yn cael ei ddrafftio. • Aliniad gweithgarwch caffael â phrosesau Uchelgais Gogledd Cymru.

PROFFIL SWYDDI A BUDDSODDI

☑ - wedi gwblhau/yn gweithredu
☑ - ar y gweill

Prosiect	Cam Caniatâd				Cam 1	Cam 2	Cam 3	Cam 4	Cam 5	Cam 6	Cam 7	Cam 8
	Y cyfnod cyn gwneud cais	Cynllunio amlinellol / Caniatâd	Cynllunio llawn / Caniatâd	Amodau wedi'u gweithredu	Pennu cyd-destun y Prosiect	Paratoi'r Achos Amlinellol Strategol	Paratoi'r Achos Busnes Amlinellol	Cymeradwyo'r Achos Busnes Amlinellol	Paratoi'r Achos Busnes Llawn	Cymeradwyo'r Achos Busnes Llawn	Gweithredu a monitro'r prosiect	Arfarnu'r Prosiect
Canolfan Prosesu Signal Digidol	Dim angen cynllunio				☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	
4G+	Gofynion cymeradwyo i'w cadarnhau				☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	
LPWAN	Dim gofynion cydsynio				☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	
Di-wifr Uwch	Dim cydsynio ar lefel y cynllun grant				☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	
Cydnerth (Morlais)	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	
Egni	☑	☑	☑		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	
Ynni Lleol Blaengar	Nid oes angen cydsynio ar lefel y gronfa				☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	
Hwb Hydrogen Caergybi	☑	☑	☑		☑	☑	☑	☑	☑			
Busnes, Arloesi a Sgiliau Trawsfynydd	☑				☑	☑	☑	☑	☑			
Cyn Ysbyty Gogledd Cymru	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	
Parc Bryn Cegin, Bangor	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	
Porth Wrecsam	☑	☑			☑	☑	☑	☑	☑			
Safleoedd ac Adeiladau Gogledd Môn	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	
Porth y Porthladd Rhydd	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	
Padeswood	Dim gofynion cydsynio (i'w gadarnhau)				☑	☑	☑	☑	☑			
Ysgol Fusnes Albert Gubay	☑	☑	☑		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	
Porthladd Mostyn	Nid oes angen caniatâd cynllunio.				☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	
Hwb Economi Gwledig Glynllifon	☑				☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	
Rhwydwaith Talent Twristiaeth	☑	☑	☑		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	
Antur Gyfrifol	☑	☑			☑	☑	☑	☑	☑			
Dyfodol Venue Cymru	☑				☑	☑	☑	☑	☑			
Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol	☑	☑	☑		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	
Opteg a Pheirianneg Menter	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	
Society 5.0	Dim angen cynllunio				☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	
Prosiect Prince	☑				☑	☑	☑	☑	☑			
Porth Busnes	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑			

PROFFIL SWYDDI A BUDDSODDI

PROSIECTAU YN CAEL EU CYFLAWNI

Rhaglen	Prosiect	Statws RAG	Swyddi		Cynllun Twf		Cyfanswm Buddsoddiad	
			Targed	Gwir*	Dyraniad (£m)*	Gwir (£m)*	Targed (£m)*	Gwir (£m)*
Cysylltedd Digidol	Canolfan Prosesu Signal Digidol		40	23	2.96	2.95	3.08	3.14
	4G+		173	0	19.54	0.04	30.31	0.04
	LPWAN		39	0	6.17	0.30	8.20	0.30
	Di-wifr Uwch		20	0	1.14	0.05	1.14	0.05
Ynni Carbon Isel	Cydnerth (Morlais)		253	8	8.87	8.87	15.99	8.87
	Cronfa Ynni Glan		186	2	24.63	0.81	102.5	0.91
	Egni		63	0	3.94	0.20	10.01	2.86
Tir ac Eiddo	Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych - Cam 1		0	0	2.00	0.53	5.00	1.85
	Parc Bryn Cegin, Bangor		83	0	7.49	2.07	8.84	2.07
	Safleoedd ac Adeiladau Gogledd Môn		95	0	7.00	0.51	10.44	1.87
	Ysgol Fusnes Albert Gubay		90	1	7.3	0.08	20.45	3.47
	Porthladd Mostyn		299	0	4.0	0.96	14.70	6.80
Bwyd-amaeth a Thwristiaeth	Academi Croeso		68	0	4.43	2.20	19.28	3.94
	Hwb Economi Gwledig Glynllifon - Llaeth Defaid ac Llaethdy Cynaliadwy		66	0	5.0	0.59	9.9	4.87
Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Gwerth Uchell	Canolfan Opteg a Pheirianneg Menter		109	13	11.99	11.38	18.82	13.77
	Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol		67	8	2.96	2.21	3.46	2.71
	Society 5.0		106	0	1.5	1.06	3.00	2.63
	Swyddfa Rheoli Portffolio		-	7	5.15	3.03	5.15	3.03
	CYFANSWM		1,757	62	126.07	37.84	290.27	63.16

PROJECTS APPROVED NOT IN DELIVERY

Rhaglen	Prosiect	Statws Rag	Swyddi		Cynllun Twf		Cyfanswm Buddsoddiad	
			Targed	Gwir*	Dyraniad (£m)*	Gwir (£m)*	Targed (£m)*	Gwir (£m)*
Tir ac Eiddo	Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych - Cam 2		70	0	4.94	0.00	80.85	0.00
	Porth y Porthladd Rhydd		223	0	3.48	0.00	19.09	0.00
Bwyd-amaeth a Thwristiaeth	Glynllifon Rural Economy Hub - Hub		40	0	6.82	0.00	9.39	0.00
	CYFANSWM		333	0	15.24	0	109.33	0.00

* Ffigyrau i'r 2 pwynt degol, o ganlyniad mae'r cyfanswm yn seiliedig ar y gwir ffigwr i'r ddau bwynt degol agosaf.

ATODIAD A - CRYNODEB O BROSIECTAU'R CYNLLUN TWF

	Prosiect	Noddwr	Crynodeb
Digidol	Canolfan Prosesu Signalau Digidol (DSP)	Prifysgol Bangor	Bydd y prosiect yn galluogi i'r Ganolfan Prosesu Signal Digidol ymestyn ei bresenoldeb a'i gylch gwaith, gan integreiddio'n llawn â'r Prosiect Strategaeth Cenedlaethol a galluogi datblygu asedau allweddol ar raddfa, gan gynnwys prawf-wely 5G, capasiti ymchwil ac offer o'r radd flaenaf.
	4G+ (Safleoedd a Choridorau Allweddol Cysylltiedig)	Uchelgais Gogledd Cymru	Bydd y prosiect hwn yn gwella cysylltedd symudol 4G mewn safleoedd economaidd allweddol yn y rhanbarth, gan dargedu llwybrau trafnidiaeth, canolfannau busnes a thwristiaeth a bydd hefyd yn cefnogi'r gwaith pellach o gyflwyno 5G yn yr ardaloedd hyn.
	Di-wifr Uwch (Campysau Cysylltiedig)	Uchelgais Gogledd Cymru	Bydd y prosiect Di-wifr Uwch yn cefnogi sefydliadau'r sector preifat a chyhoeddus i fabwysiadu'r technolegau diwifr diweddaraf i gefnogi gwell darpariaeth gwasanaeth, effeithlonrwydd busnes, arloesi a thwf, yn enwedig trwy ddefnyddio rhaglenni y rhyngrwyd pethau.
	LPWAN (Campysau Cysylltiedig)	Uchelgais Gogledd Cymru	Mae'r prosiect hwn yn ceisio cyflwyno gwasanaeth rhwydwaith LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) estynedig a hygyrch drwy'r rhanbarth, gan roi datrysiad cost effeithiol i ddefnyddwyr busnes a sector cyhoeddus i fabwysiadu ceisiadau rhyngrwyd o bethau ac arloesedd ategol.
Ynni Carbon Isel	Cydnerth (Morlais)	Menter Môn	Buddsoddi mewn seilwaith i gysylltu â rhwydwaith y National Grid a monitro effeithiau amgylcheddol morol. Bydd hyn yn galluogi cynnydd yn y defnydd o dyrbinau gan ddatblygwyr morol a chynhyrchu ynni adnewyddadwy.
	Egni	Prifysgol Bangor	Buddsoddi mewn datblygu'r isadeiledd ym Mhrifysgol Bangor a Pharc Gwyddoniaeth Menai, gwella galluedd y Gogledd a'r DU ar gyfer arloesedd mewn ynni carbon isel a meysydd cysylltiedig, gan helpu i greu'r amodau ar gyfer mewnfuddsoddiad newydd a thwf busnes yn y gadwyn gyflenwi ynni carbon isel yn y Gogledd
	Ynni Lleol Blaengar	Uchelgais Gogledd Cymru	Er mwyn helpu i gyflawni targedau ynni adnewyddadwy, datgarboneiddio a pherchnogaeth leol, bydd y prosiect yn cefnogi prosiectau hwyluso arloesol ac arddangoswyr sy'n goresgyn methiannau'r farchnad a datgloi buddsoddiad sector preifat a chymunedol mewn datrysiadau ynni lleol blaengar.
	Hwb Hydrogen Caergybi	Menter Môn	Bydd y prosiect yn adeiladu cyfleuster cynhyrchu hydrogen gwyrdd ym Mharc Cybi, Caergybi, gan gynhyrchu oddeutu 2000+kg/y dydd o hydrogen gwyrdd, gan gyflenwi cwsmeriaid trafnidiaeth y ffordd, morwrol a rheilffordd ar draws Gogledd Cymru.
	Canolfan Arloesi a Sgiliau Busnes Trawsfynydd	Cyngor Gwynedd	Cynllun a fydd yn cynnwys adeilad i gynnwys mannau ar gyfer swyddfeydd, labordai (union fanyleb i'w chadarnhau) a chyfleusterau ategol (lle cyfarfod, caffi/ffreutur ac ati), i gefnogi'r diwydiant niwclear ac ynni carbon isel ynghyd â'r gymuned wyddonol, wedi'i leoli ar Safle Trawsfynydd.
Tir ac Eiddo	Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych	Uchelgais Gogledd Cymru	Bydd arian y Cynllun Twf yn cynorthwyo yng nghyflwyniad safle wedi'i glirio a'i adfer gyda phrif wasanaethau er mwyn dwyn ymlaen datblygiad preswyl a masnachol defnydd cymysg
	Parc Bryn Cegin, Bangor	Uchelgais Gogledd Cymru	Darparu arwynebedd llawr diwydiannol i fodloni'r galw hysbys am unedau.
	Porth Wrecsam	Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam	Mae'r prosiect hwn yn ddatblygiad cynaliadwy o ardal fywiog wedi'i hadfywio, sy'n creu canolbwynt i gefnogi buddsoddiad busnes a hwb trafnidiaeth aml-ddull gyda chysylltiadau at deithio llesol.
	Safleoedd ac Adeiladau Gogledd Môn	Cyngor Sir Ynys Môn	Darparu 2,200 metr sgwâr o ofod busnes yng ngogledd Ynys Môn gan greu o leiaf 59 o swyddi a throsoli twf y Porthladd Rhydd ac ynni carbon isel.
	Porth y Porthladd Rhydd	Cyngor Sir Ynys Môn	Datgloi 6,750 metr sgwâr o ofod busnes yn Llangefni, gan greu o leiaf 186 o swyddi a gwneud y mwyaf o fanteision Porthladd Rhydd Ynys Môn.
	Padeswood	Trafnidiaeth Cymru	Gwelliannau i'r rheilffordd i gael gwared ar gyfyngiadau a mynd i'r afael â mynediad/allanfa ar gyfer cludo nwyddau rheilffordd i mewn i Waith Sment Padeswood
	Porthladd Mostyn	Porthladd Mostyn	Uwchraddio'r angorfa ac adfywio'r hen safle diwydiannol.
	Ysgol Fusnes Albert Gubay	Prifysgol Bangor	Adeiladu Ysgol Fusnes Albert Gubay ym Mhrifysgol Bangor.
Bwyd amaeth a thwristiaeth	Hwb Economi Gwledig Glynllifon	Grŵp Llandrillo Menai	Y weledigaeth yw creu Hwb Economi Gwledig arbennig o'r radd flaenaf yng Nglynllifon, sy'n cynnig ystod o gyfleusterau a gwasanaethau i gryfhau a gwella'r economi rhanbarthol, yn benodol drwy dyfu'r sector bwyd a diod.
	Academi Croeso (Rhwydwaith Talent Twristiaeth)	Grŵp Llandrillo Menai	Sicrhau dyfodol yr ystod o ddarpariaeth sgiliau a chynyddu buddion masnachol o un o'r sectorau mwyaf sefydledig yn y rhanbarth. Bydd y rhwydwaith talent yn ysgogi cydweithrediad cyhoeddus-preifat i gydlynu gweithrediad ar sgiliau a datblygu cynnyrch i drawsnewid a sbarduno twf y sector twristiaeth a lletygarwch yn y rhanbarth.
	Antur Gyfrifol	Zip World	Prosiect aml-elfen fel rhan o becyn cynaliadwy ac eco-dwristiaeth sy'n cynnwys Car Cebl cynaliadwy newydd, Slate Explorer gan gynnwys platfform gwylio ymwelwyr, a Swing.
	Dyfodol Venue Cymru	Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy	Prosiect a fydd yn ehangu cyfleusterau Venue Cymru, yn rhoi hwb i swyddi, yn torri carbon, ac yn denu sioeau a chynadleddau mawr a buddsoddiad diwylliannol.
Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel	Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol (CEB)	Prifysgol Bangor	Bydd y Ganolfan Biotechnoleg Amgylcheddol yn ganolfan gyda'r gorau yn y byd o ran canfod a nodweddu ensymau newydd o bwys diwydiannol. Bydd y Ganolfan Biotechnoleg Amgylcheddol yn darparu sylfaen gref ar gyfer denu ymchwilwyr blaenllaw ar lefel fyd-eang, cyllid ymchwil cyhoeddus a masnachol arwyddocaol a mewnfuddsoddiad i Gymru.
	Canolfan Opteg a Pheirianneg Menter	Prifysgol Wrecsam	Bydd y Ganolfan Opteg a Pheirianneg Menter yn darparu cyfleusterau sydd wedi'u targedu i roi hwb i ddatblygu sgiliau lefel uchel i'r rhanbarth a galluogi i fusnesau bach a chanolig eu maint a busnesau mawr weithio mewn partneriaeth gyda Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam ar ymchwil a datblygu opteg, cyfansoddion a thanwydd cell hydrogen sy'n cael ei yrru'n fasnachol.
	Society 5.0	Prifysgol Wrecsam	Gwella'r Ganolfan Opteg a Pheirianneg Menter a galluogi i'r diwydiant gael mynediad at ragor o adnoddau peirianneg hynod-fanwl o'r radd flaenaf.
	Prosiect Prince	Knauf	Adeiladu ffatri wlân mwynol 110kt gyda ffwrnais arc tanddwr (SAF), yn bennaf i wasanaethu marchnadoedd y DU ac Iwerddon.
	Porth Busnes Prifysgol Wrecsam	Prifysgol Wrecsam	Pontio rhwng Prifysgol Wrecsam a diwydiant lleol, gan feithrin cydweithio, arloesi, creu swyddi a thwf economaidd cynhwysol.

ATODIAD – Diweddariad Chwarter 2

Uchelgais Gogledd Cymru
Ambition North Wales

Cronfa Ynni Glân
Clean Energy Fund


Diweddariad Chwarter 2d at Ch2 26/27


Enw sefydliad	Sir	Disgrifiad o'r prosiect	Grant	Benthyciad	Arian cyfatebol (Allbwn 2.1)	Cyfanswm gwerth y prosiect (SO2)	Swyddi a grewyd (SO1) (Allbwn 1.1)	Swyddi wedi diogelu wyd (Allbwn 1.3)	Lleihad carbon (SO3)	Perchnogaeth lleol (SO4)	Statws
	Wrecsam	Pwmp gwres, solar, effeithiolrwydd ynni, batri	£ 235,000	£ 10,000	£ 290,000	£ 535,000	3	0	12	100%	HoT *
Rugby Consortium	Amryw	Solar, batri, pwyntiau gwefru EV, effeithiolrwydd ynni, goleuadau LED	£ 263,513	£ 68,943	£ 194,572	£ 527,028	1	7	44	100%	HoT *
		Cyfanswm Sector Wirfoddol	£ 498,513	£ 78,943	£ 484,572	£ 1,062,028	4	7	56	100%	
Ty'n Yr Onnen Farm Ltd	Gwynedd	Paneli Solar	£ -	£ 25,001	£ 12,449	£ 37,450	1	0	13	100%	Cyflawni
		Cyfanswm Sector Breifat	£ -	£ 25,001	£ 12,449	£ 37,450	1	-	13	100%	
		Cyfanswm Cronfa Ynni Lleol	£ 498,513	£ 103,944	£ 497,021	£ 1,099,478	5	7	69	100%	

HoT * - Prosiect wedi gymeradwyo a'r sefydliad ar hyn o bryd mewn trafodaethau Cyfreithiol/Masnachol

**dyma ddata y chwarter ac ddim yn ddata cronnus*

Datganiadau o ddiddordeb wedi ei cwblhau hyd at Ch2 26/27

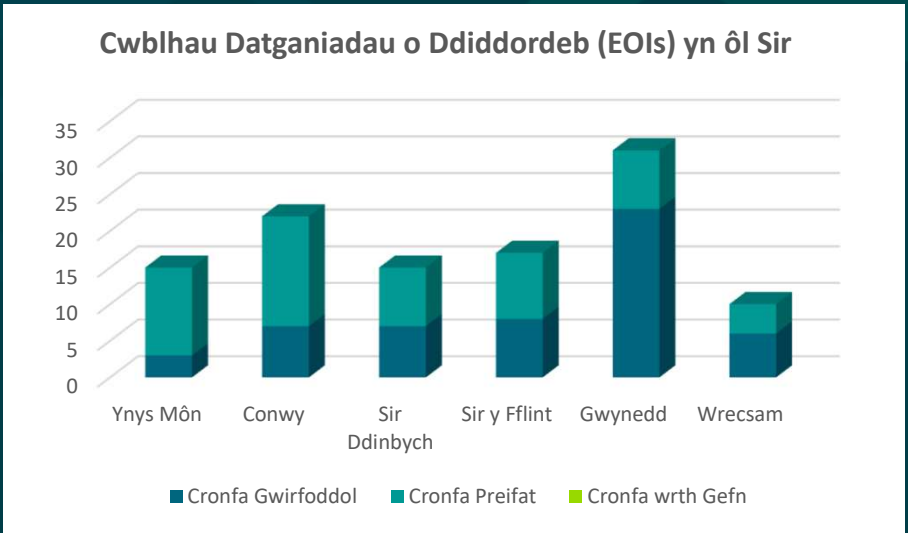

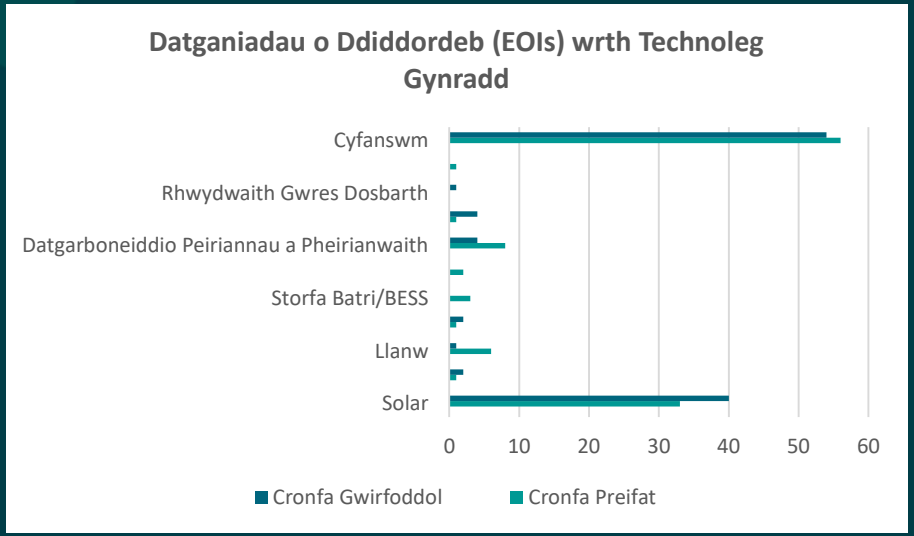

**mae'r data yn y graff yn gronnus*
